

**Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo  
Oficina Nacional de Estadística (ONE)**



**Informe trimestral de seguimiento del proyecto  
*X Censo Nacional de Población y Vivienda  
de la República Dominicana*  
Código SNIP 13867  
Octubre-diciembre 2020**

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**Alma Vargas**  
Encargada de Planificación y Desarrollo



**Enero 2021**

## Tabla de contenido

<b>Introducción</b> .....	3
<b>1. Resultados de la Planificación estratégica y operativa del proyecto <i>X Censo Nacional de Población y Vivienda</i></b> .....	4
1.1. Resultados orientados a la planificación estratégica 2020 .....	4
1.2. Resultados orientados a la planificación operativa 2020 .....	7
<b>2. Actualizaciones del presupuesto para el levantamiento de la Prueba Censal 2021</b> .....	12
<b>3. Asignación y ejecución presupuestaria 2020</b> .....	14
<b>4. Conclusiones</b> .....	18
<b>5. Anexos</b> .....	19
Anexo 1: Avances de procesos cartográficos por provincias.....	19

## **Introducción**

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) atendiendo a su función misional, se encuentra inmersa en la realización del proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 (X CNPV 2020), con el principal objetivo de proporcionar al País, información demográfica y socio-económica relativa a todos los habitantes, a los hogares y las características de las viviendas que ocupan, para cada uno de los ámbitos políticos administrativos y centros poblados o localidades, la cual es necesaria para planificar las políticas públicas que demanda el país.

En virtud que el Censo Nacional de Población y Vivienda constituye la mayor operación estadística del país, desde el año 2017, la ONE ha venido realizando una serie actividades preparatorias que se enmarcan principalmente en la fase de planeación y diseño, las cuales son necesarias para poder agotar satisfactoriamente, las etapas de levantamiento censal, procesamiento y difusión de los datos.

El presente informe tiene como propósito principal estimular la transparencia de las ejecutorias y actos de la administración pública, dando a conocer a los ciudadanos, las actividades realizadas durante el cuarto trimestre del año 2020, como parte de la ejecución de la planificación del proyecto. Así como, los desafíos más importantes que se han presentado en el transcurso del proceso y aprendizajes que han marcado el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por último, exponer conclusiones y recomendaciones que permitan continuar desarrollando el proyecto de manera exitosa.

## 1. Resultados de la Planificación estratégica y operativa del proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

El X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana constituye un resultado estratégico dentro del sistema de planificación de la ONE, abarcando no solo la planificación propia de la institución, sino que debido a su relevancia e impacto en la planificación nacional constituye un producto terminal del Plan Nacional Plurianual del Sector Público PNPSP (ver tabla 1 a continuación).

El resultado comprometido para el año 2020 en el PNPSP es de “Censo levantado”. Lo anterior no ha podido cumplirse, dado que el proyecto aún se encuentra en la fase de planeación y preparación. En este sentido, el resultado par el año 2020 en el PNPSP es de “0” Este resultado impacta en forma de cascada todos los instrumentos que convergen en la planificación.

Tipo	ID	Nombre Producto	Unidad Medida	Pr.	Año Base	Línea Base	Producción			
							2017	2018	2019	2020
T	1297	Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV 2020	Censo levantado	A	2015	0	0	0	0	0

Fuente: Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público – RUTA

### 1.1. Resultados orientados a la planificación estratégica 2020

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020) se incluyó el X CNPV, como parte del conjunto de productos que responden al Eje 3 *Producción y Difusión de la Información Estadística*, siguiendo el siguiente esquema:

**Tabla 2. Composición estratégica del Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana, en el marco de la planificación estratégica 2018-2020 de la ONE.**

Código	Nombre	Categoría
<b>E-3</b>	<b>Producción y Difusión de la Información Estadística</b>	<b>Eje</b>
3.0	Fortalecer los procesos de generación y difusión de la producción estadística de la institución, garantizando la calidad de su contenido, la excelencia de su difusión y el uso adecuado de los grupos de interés, nacionales e internacionales	Objetivo Estratégico
3.1	Generación de estadísticas oficiales que conciernen a la ONE con calidad y oportunamente	Estrategia
3.1.01.	X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado	Producto
3.1.01.01.	Cumplimiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda según ruta crítica establecida	Indicador

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020, ONE

El indicador asociado al producto X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado se describe según la siguiente ficha:

**Tabla 3. Ficha del indicador de producto “X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado”**

<b>Nombre</b>	3.1.01.01. Cumplimiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda según ruta crítica establecida
<b>Descripción</b>	Porcentaje de ejecución del X Censo Nacional de Población y Vivienda, según las propuestas para la realización de las operaciones censales en los años correspondientes y la planificación de los operativos censales
<b>Área responsable</b>	Dirección de Censos y Encuestas
<b>Fórmula de cálculo</b>	Ejecutado/planificado*100
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje
<b>Frecuencia</b>	Anual
<b>Línea base</b>	0
<b>Meta al 2020</b>	80%

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020, ONE

#### **Avance y cumplimiento según metas por año:**

En el marco de la planificación estratégica de la ONE el hito de mayor peso del producto “*X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado*”, para el año 2020, lo constituye el “levantamiento Censal”. correspondiente al operativo de campo con cobertura nacional de levantamiento de información sobre las personas, hogares y viviendas a nivel nacional. Este hito no pudo ser alcanzado ya que fue necesario hacer un reajuste en el calendario de actividades del proyecto al momento que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dispuso el cambio de fecha de realización de la “prueba censal”, de octubre 2019 a octubre 2020. Cabe destacar que se considera como imprescindible la realización de la prueba Censal para someter a prueba los diferentes instrumentos y tecnologías que serán empleadas en el operativo de levantamiento censal.

Considerando lo anterior, la prueba censal fue incluida en la planificación del año 2020, específicamente a ejecutarse en el mes de octubre. Sin embargo, la inesperada presencia de la pandemia COVID19 en el país y los efectos que las medidas de distanciamiento social , la implementación parcial del teletrabajo, entre otras medidas paliativas producto de la actual crisis derivaron en la segunda posposición de la prueba censal para el año 2021, considerando el uso de metodología de entrevista cara a cara, la restricción y lentitud de nuestras operaciones por la cuarentena de empleados, así como ,la disposición por parte de la Direccion General de Presupuesto de la no compra de mobiliario y equipos.

**Tabla 4. Reporte de avance de producto “X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado” al 31 de diciembre 2020.**

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento
<b>A 2018</b>	20,00	20,00	100,00% 
A 2019	10,00	20,00	50,00% 
<b>A 2020</b>	20,00	40,00	<b>50,00%</b> 

Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS, ONE

## 1.2. Resultados orientados a la planificación operativa 2020

El Plan Operativo Anual (POA) de la ONE permite hacer operativas las estrategias contenidas en la planificación estratégica. En este orden, las ejecutorias del proyecto *X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana* se han hecho visible en cada uno de los POA, del Plan Estratégico vigente.

Para el año 2020 las actividades comprometidas en el POA respecto al producto *X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado*, se enmarcan en la selección y reclutamiento del personal operativo de la prueba censal; La realización de capacitaciones a dicho personal; Adquisición de insumos y desarrollo de logística para la prueba censal, el operativo de la prueba y la actualización de los planes y estrategias según los resultados que arrojaría la prueba censal, (ver tabla 5)

**Tabla 5. Planificación año 2020 a nivel de operación del producto *X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado***

Tarea	Inicio	Fin	Avance	Peso	Estatus
<b>3.1.01.01. Lineamientos e investigaciones previas al levantamiento de la información principal</b>	<b>15/6/2020</b>	<b>30/12/2020</b>	<b>1%</b>	<b>100</b>	<b>Suspendido</b>
3.1.01.01.01 Reclutar y seleccionar personal operativo para la prueba censal	23/7/2020	14/9/2020	0%	10	Suspendida
3.1.01.01.02 Capacitar personal para la prueba censal	14/9/2020	30/10/2020	0%	20	Suspendida
3.1.01.01.03 Desarrollar la logística de materiales (adquisición, empaque y distribución de materiales e insumos)	15/6/2020	8/10/2020	10%	10	Suspendida
3.1.01.01.04 Hacer el levantamiento de la prueba Censal	16/10/2020	22/10/2020	0%	50	Suspendida
3.1.01.01.05 Actualizar planes y estrategias	2/11/2020	30/12/2020	0%	10	Suspendida

Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS

Evidentemente, la decisión de suspender la realización de la prueba censal en el año 2020, implicaba la suspensión de las operaciones preparatorias listadas en la tabla anterior, ya que por su naturaleza son acciones que deben realizarse con un breve margen de tiempo antes de la prueba censal. Por ejemplo, se hace imposible considerar la contratación de personal operativo para la prueba cunado, aun no se ha fijado una fecha exacta para la realización de este operativo de prueba.

Una buena Cartografía Censal es elemental para la obtención de los productos cartográficos que serán la base no solo del operativo censal, sino de la planificación y adecuada compra y distribución de los materiales censales, de igual manera, ello definirá la cantidad de personal que será requerido para el momento de realizar el operativo censal.

El proceso de actualización cartográfica se compone de las siguientes actividades:

1. Adecuación de la base cartográfica existente (Preparación previa de la información a actualizar y generación del mapa base).
2. Levantamiento en campo.
3. Procesamiento de los datos.
  - 3.1. Codificación.
  - 3.2. Digitalización.
  - 3.3. Generación de la segmentación.
  - 3.4. Edición e impresión de mapas.

Los trabajos de levantamiento en campo se encuentran en un nivel de avance de un 97.37 %, quedando pendiente a la fecha, la culminación de los trabajos de campo de la provincia de Santiago. El trabajo de campo fue detenido a razón de la actual situación de pandemia del COVID-19 y el estado de Emergencia Nacional decretado desde el mes de marzo del presente año. La tabla 6 a continuación presenta el porcentaje de avance de la actualización cartográfica al 31 de diciembre del año 2020.

**Tabla 6. Porcentaje de avance de la actualización de la Base Cartográfica Censal**

<b>Tarea</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Avance</b>	<b>Peso</b>
<b>2.1.02.01. Actualización cartográfica para la producción estadística nacional</b>	<b>02/01/2020</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>41.2%</b>	<b>60</b>
2.1.02.01.01 Validar el levantamiento cartográfico	02/01/2020	31/08/2020	0%	50
2.1.02.01.02 Realizar la codificación cartográfica de la base actualizada	02/01/2020	31/08/2020	75%	25
2.1.02.01.03 Digitalizar la base cartográfica	02/01/2020	31/08/2020	90%	25

Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS ONE



Dentro del subproducto POA “*Actualización cartográfica para la producción estadística nacional*”, la actividad de validación al levantamiento cartográfico no tuvo avances ya que es un trabajo de campo, el cual se vio afectado debido a la actual crisis sanitaria y la no disponibilidad de fondos.

La meta para el 2020 era tener el 100% de las provincias validadas. Dentro de la planificación operativa, esta actividad constituyó la de mayor peso, afectando proporcionalmente el avance general del producto en el POA.

En cuanto a la codificación cartográfica, la meta para el 2020 fue contar con el 100% de las provincias codificadas, para lo cual se debieron trabajar este año el 60% de las provincias restantes (24 provincias), de las cuales se encuentran codificadas 18 al cuarto trimestre:

San Juan de La Maguana, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Valverde, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Samaná, La Altagracia, el Distrito Nacional, San José de Ocoa y La Romana.

De las 26 provincias planificadas para la digitalización en el 2020 se completaron: Monte Cristi, Valverde, Duarte, Espaillat, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Vega, Azua, Monseñor Nouel, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Peravia, San Cristóbal, Samaná, La Altagracia, San Juan de La Maguana, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez y La Romana, encontrándose en proceso Santiago de Los Caballeros y Santo Domingo.

**Tabla 7. Porcentaje de avance de la Generación de productos para el X Censo Nacional de Población y Vivienda**

Tarea	Inicio	Fin	Avance	Peso
<b>2.1.02.02. Generación de productos para el X Censo Nacional de Población y Vivienda</b>	<b>01/10/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>0%</b>	<b>20</b>
2.1.02.02.01 Generar mapas para segmentación censal	01/10/2020	31/12/2020	0%	25
2.1.02.02.02 Realizar la segmentación censal	01/10/2020	31/12/2020	0%	25
2.1.02.02.03 Digitalizar la segmentación censal	01/10/2020	31/12/2020	0%	25
2.1.02.02.04 Generar los mapas censales	01/10/2020	31/12/2020	0%	0

Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS

El segundo subproducto asociado a la Base Cartográfica es la generación de los productos para el X CNPV, el cual tenía como fecha de inicio el mes de octubre, quedando sin avance y replanificado en su totalidad para ser realizado en la próxima fecha que se establezca para realizar el operativo censal.

Asimismo, el subproducto 2.1.02.03. *Elaboración de mapas provinciales, municipales y urbanos para el levantamiento censal*, quedó inhabilitado con control de cambios del POA 2020, hasta que se defina la nueva fecha del levantamiento censal.

**Tabla 8. Porcentaje de avance del Marco Censal 2020 realizado**

Tarea	Inicio	Fin	Avance	Peso
<b>2.1.05.01. Elaboración del marco por provincias</b>	<b>01/05/2020</b>	<b>30/12/2020</b>	<b>14.4%</b>	<b>1</b>
2.1.05.01.01 Codificar las áreas operativas censales	01/05/2020	30/12/2020	30%	35
2.1.05.01.02 Elaborar los segmentos censales y distribución espacial de las áreas operativas censales.	01/05/2020	30/12/2020	6%	35
2.1.05.01.03 Generación estandarizada de la base de datos censal	01/05/2020	30/12/2020	6%	30

Fuente: Sistema informático de seguimiento y evaluación – DELPHOS ONE

Durante el cuarto trimestre del 2020 se iniciaron los trabajos de codificación en las provincias: Hato Mayor, Sánchez Ramírez y El Seibo. No hubo avances en la elaboración de los segmentos censales y la generación estandarizada de la base de datos censal.

A nivel general del proceso de actualización cartográfica es de un **97.37 % de avance de levantamiento de campo respecto a todo el territorio nacional**; un **95%** de avance en la digitalización de los elementos cartográficos y logrado un **61% de todo el universo de la codificación de las manzanas y edificaciones (número único)**. En adición:

### **Generación de la segmentación**

Es la distribución operativa de las cargas de trabajo asignadas a los empadronadores, representadas en planos cartográficos Georreferenciadas para el levantamiento censal. En esta fase se avanzado a la fecha un **43%**, las provincias que se entregaran estarán en condición de pre-segmentación, ya que estarían pendiente para su segmentación definitiva la verificación en campo de la base de datos cartográfica.


## Edición e impresión del mapa

Esta actividad tiene la misión de generar todos los ajustes digitales y controles de estandarización de los datos, de forma de quedar preparados como plataforma final de la cartografía y aplicaciones informáticas.

En este proceso el nivel de avance se mantiene en un **16.41%**, como producto de la edición de los planos de las primeras provincias que agotaron todo su proceso.

En este momento se tendría que esperar a tener toda la base de datos estandarizada y normalizada, para luego proceder con esta fase.

### Gráfico 1. Porcentaje de avance según fase de la Cartografía Censal y Avances

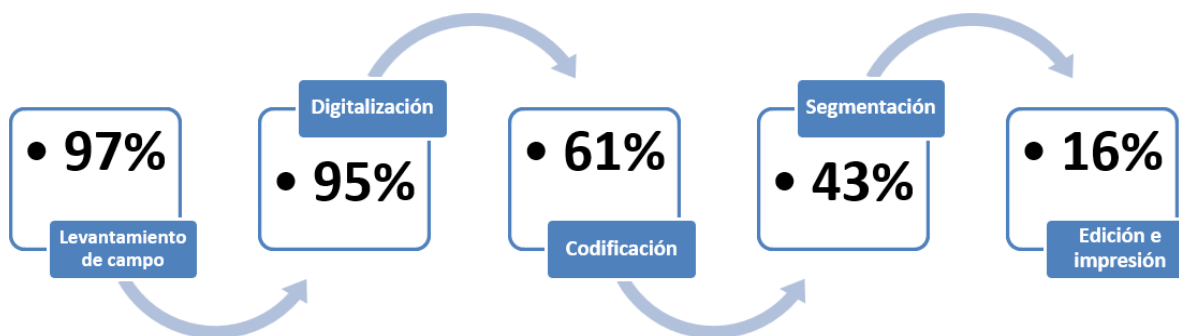

**Fuente:** Informe trimestral del Departamento de Cartografía de la ONE.

## 2. Actualizaciones del presupuesto para el levantamiento de la Prueba Censal 2021

El costo total del proyecto fue estimado a razón de RD\$ 314.88 por persona, cifra la cual, según los parámetros internacionales, se encuentra dentro del rango estimado de los censos, ya que por convención se ha establecido que el costo de un censo debe rondar entre 1 y 5 dólares por persona. En este sentido, el costo total estimado del proyecto es de Tres Mil Doscientos Noventa Millones, Cuarenta Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos Dominicanos con Tres Centavos (RD\$3,290,040,373.03).

Para el año 2020 el presupuesto asignado para las ejecutorias del proyecto fue de \$300,000,000.00. No obstante, Por disposición de DIGEPRES la asignación de RD\$300,000,000.00 para el año 2020 sufrió una disminución de RD\$25,490,000.00. Por lo que monto actual asignado para el año 2020 es de RD\$274,510,000.00.

A pesar de la situación de Emergencia Nacional que enfrenta el país y los ajustes que se encuentra realizando la nueva gestión gubernamental en todo el aparato Estatal con miras de eficientizar el gasto público. En el mes de septiembre, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo solicitó a la ONE realizar una revisión al presupuesto correspondiente al 2021, estas revisiones estuvieron siendo realizadas hasta mediados de noviembre por representantes de los equipos de las áreas internas de la ONE y a partir del mes de octubre las mismas fueron lideradas por el consultor José Guzmán, experto contratado por el UNFPA para apoyar las labores de planificación censal.

Luego de cinco actualizaciones presupuestarias, se concluyó una versión que fue presentada en el mes de noviembre de 2020, en una reunión con el *task force*, que el ministro conformó para trabajar todo el tema concerniente al censo. En dicha reunión se le presentó a los viceministros y directores generales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo las propuestas de presupuestos que se tenían hasta el momento.

Posterior a esto, la Directora Nacional de la ONE informó la decisión de que el levantamiento de del X Censo Nacional de Población y Vivienda se realizaría utilizando dispositivos móviles de captura a nivel nacional. Con esta decisión instruyó a los líderes de equipo para que realizaran una nueva revisión y actualización del presupuesto.

Estas revisiones fueron concluidas en el mes de diciembre, dando como resultado un presupuesto ascendente a RD\$246,254,329.29 monto que luego sufrió un ajuste a raíz de unas sugerencias de la directora y el consultor para quedar en RD\$ RD\$ 236,048,467.35.

El monto anteriormente señalado corresponde a la ejecución de la prueba censal a realizarse durante 7 días y con dispositivos de captura móviles, con estos datos desde la dirección se le solicitó al equipo preparar dos simulaciones: una correspondiente a un levantamiento durante 14 días y otra a un levantamiento durante 21 días.

Ambos escenarios fueron presentados al ministro en fecha 10 de 2020 con otras informaciones que le arrojan luz sobre la importancia de los ejercicios de pruebas y las experiencias de los países de la región.

Posterior a la presentación realizada al ministro, se llevó cabo una reunión virtual liderada por la directora, entre el equipo ONE y el consultor. El objetivo era concluir la revisión del presupuesto e iniciar la revisión del Plan Director del Proyecto. En esa reunión se acordó realizar unos nuevos ajustes al presupuesto, debido a unos cambios que estaba solicitando el Departamento de Tecnología en función al escenario de 21 días de levantamiento.

Se realizaron reuniones para consensuar los ajustes y revisar otros detalles referentes a las estimaciones de población y a la segmentación cartográfica, a raíz de las cuales fueron remitidos los presupuestos correspondientes a los diferentes escenarios. Siendo este el último ejercicio realizado sobre modificación presupuestaria, actualmente se está a la espera de las autoridades tomen la decisión sobre la duración del levantamiento.

### **Otras Actividades realizadas**

A raíz de las nuevas directrices para la ejecución del proyecto el equipo ha iniciado un proceso de revisión y actualización del marco conceptual, las estrategias, planes y documentos. Este ejercicio ha iniciado con el Plan Director, documento que integra de manera resumida las principales estrategias y planes. Estas revisiones son preliminares ya que aún faltan determinar temas de gran impacto, como es el caso de la duración del levantamiento.

### **3. Asignación y ejecución presupuestaria 2020**

Como se ha narrado a lo largo de este informe, las ejecutorias de la planificación institucional. El COVID19 ha impactado significativamente el cumplimiento de la planificación institucional, dificultando la adecuada implementación de los recursos financieros asignados a este proyecto para el año 2020. Cabe destacar que parte de los recursos en esta fase del proyecto serían ejecutados en el avance de adecuación de la infraestructura tecnológica y contratación de personal para fines del operativo de la prueba y capacitaciones.

La tabla 9 a continuación muestra la ejecución presupuestaria según objeto del gasto. Como se mencionó anteriormente, por disposición de DIGEPRES la asignación de RD\$300,000,000.00 para el año 2020 sufrió una disminución de RD\$25,490,000.00. Por lo que monto actual asignado para el año 2020 es de RD\$274,510,000.00.

**Tabla 9. Ejecución presupuestaria según objeto del Gasto correspondiente al año 2020 del proyecto  
X Censo Nacional de Población y Vivienda.**

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto inicial 2020	Presupuesto vigente 2020	Ejecutado 2020	Disponible al (31/12/2020)
<b>Componente: Diseño del proyecto</b>					
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	58,845,760.00	588,000.00	577,000.00	11,000.00
2.1.1.2.08	Remuneración personal de carácter temporal	0.00	50,830,760.00	30,611,600.00	20,219,160.00
2.1.1.2.09	Remuneración personal de carácter eventual	2,301,645.00	13,496,645.00	8,842,833.34	4,653,811.66
2.1.1.4.01	Salario Anual No. 13	4,513,141.00	4,592,988.25	3,283,730.66	1,309,257.59
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	11,135,500.00	11,135,500.00	0.00	11,135,500.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	4,172,164.00	4,260,080.00	2,143,691.34	2,116,388.66
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,178,049.00	4,266,089.00	2,214,390.60	2,051,698.40
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	612,768.00	626,207.62	273,926.14	352,281.48
2.2.1.2.01	Servicios telefónicos de larga distancia	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,978,536.00	1,978,536.00	357,119.22	1,621,416.78
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
2.2.1.7.01	Agua	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos solidos	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	75,830,752.00	49,385,166.95	48,031,487.00	1,353,679.95
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	657,505.00	657,505.00	0.00	657,505.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	20,754,144.00	19,818,144.00	15,321,550.80	4,496,593.20
2.2.4.1.01	Pasajes	1,901,726.00	1,901,726.00	848,170.33	1,053,555.67
2.2.4.4.01	Peaje	43,264.00	43,264.00	43,264.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	575,952.00	5,575,952.00	0.00	5,575,952.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	849,929.00	849,929.00	0.00	849,929.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	2,713,000.00	2,713,000.00	0.00	2,713,000.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00

<b>SubCuenta CCP-AUX</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto inicial 2020</b>	<b>Presupuesto vigente 2020</b>	<b>Ejecutado 2020</b>	<b>Disponible al (31/12/2020)</b>
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	0.00	100,000.00	28,910.00	71,090.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,400,000.00	1,400,000.00	14,176.06	1,385,823.94
2.2.7.2.08	Servicio de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	200,000.00	200,000.00	69,030.00	130,970.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	647,250.00	647,250.00	148,208.00	499,042.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	17,235,756.00	7,235,756.00	7,097,994.37	137,761.63
2.2.8.8.01	Impuestos	29,200.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	337,459.00	337,459.00	0.00	337,459.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	80,060.00	80,060.00	0.00	80,060.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	25,958.00	25,958.00	0.00	25,958.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	90,854.00	90,854.00	0.00	90,854.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	177,173.00	177,173.00	0.00	177,173.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	139,812.00	139,812.00	0.00	139,812.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
2.3.5.5.01	Artículos plásticos	25,309.00	25,309.00	0.00	25,309.00
2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,576,323.84	3,576,324.00	-0.16
2.3.7.1.02	Gasoil	2,251,240.00	674,916.16	674,916.00	0.16
2.3.9.2.01	útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,924,250.00	1,924,250.00	0.00	1,924,250.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p	36,949,512.00	8,885,469.13	0.00	8,885,469.13
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	460,476.00	460,476.00	18,320.68	442,155.32
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	2,900,507.00	18,371,207.00	2,620,436.26	15,750,770.74
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	108,160.00	108,160.00	74,340.00	33,820.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	8,551,506.00	11,151,506.00	0.00	11,151,506.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00



<b>SubCuenta CCP-AUX</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto inicial 2020</b>	<b>Presupuesto vigente 2020</b>	<b>Ejecutado 2020</b>	<b>Disponible al (31/12/2020)</b>
	calefacción y refrigeración industrial y comercial				
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	26,073,837.00	24,645,222.05	0.00	24,645,222.05
2.6.8.8.01	Informáticas	5,852,846.00	15,151,346.00	898,305.62	14,253,040.38
	<b>TOTAL</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>274,510,000.00</b>	<b>128,363,724.42</b>	<b>146,146,275.58</b>

**Fuente:** Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

#### 4. Conclusiones

A continuación, destacamos los puntos más relevantes tratados en el presente informe.

1. El Censo Nacional de Población y Vivienda constituye la mayor operación estadística del país. Proporcionando información sociodemográfica de interés para la implantación de política de vivienda, salud, educación económica, y otras ejecutorias de desarrollo nacional. En este sentido, el proyecto *X Censo nacional de población y Vivienda* debe continuar considerándose relevante en el marco de las ejecutorias del Estado.
2. En 2019 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dispuso el cambio de fecha de realización de la “prueba censal”, de octubre 2019 a octubre 2020. Este ajuste calendario impactó el cumplimiento de la planificación comprometida de la ONE en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, El Plan Estratégico Institucional de la ONE y el Plan Operativo Anual 2020.
3. En el contexto actual de pandemia mundial, las medidas de distanciamiento social, la implementación del teletrabajo, entre otras medidas paliativas producto de la actual crisis generada por el COVID19, han impactado significativamente el cumplimiento de la planificación del proyecto y, en consecuencia, dificultando la adecuada implementación de los recursos financieros asignados durante el año 2020.
4. La crisis generada por el COVID 19, derivó en una segunda posposición de la prueba censal para el año 2021, considerando que en el contexto actual el uso de metodologías de entrevista cara a cara, la restricción y lentitud de nuestras operaciones por la cuarentena de empleados, así como, la disposición por parte de la Dirección General de Presupuesto de la no compra de mobiliario y equipos. Así como, los esfuerzos de ajustes con fines de eficientización del gasto público emprendidos por la actual gestión de gobierno a los diferentes planes y proyectos del Estado.
5. Con el fin de eficientizar el gasto público, desde el mes de septiembre 2020, el proyecto está siendo sometido a una revisión del presupuesto.

## 5. Anexos

### Anexo 1: Avances de procesos cartográficos por provincias

Orden	Provincia	Adecuación	Levantamiento de campo	Digitalización	Codificación	Segmentación	Edición
1	PEDERNALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	INDEPENDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	SAN PEDRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	BARAHONA	100%	100%	100%	100%	100%	75%
5	BAORUCO	100%	100%	100%	100%	100%	75%
6	ELÍAS PIÑA	100%	100%	100%	100%	100%	0%
7	SAN JUAN	100%	100%	100%	100%	100%	0%
8	DAJABÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%
9	SAMANÁ	100%	100%	100%	50%	80%	0%
10	SANCHEZ RAMÍREZ	100%	100%	100%	50%	100%	0%
11	MONTE PLATA	100%	100%	100%	50%	100%	0%
12	MONSEÑOR NOUEL	100%	100%	100%	50%	0%	0%
13	EL SEIBO	100%	100%	100%	50%	25%	0%
14	HATO MAYOR	100%	100%	100%	50%	100%	0%
15	LA ALTAGRACIA	100%	100%	100%	50%	0%	0%
16	SANTIAGO RODRÍGUEZ	100%	100%	100%	40%	0%	0%
17	MONTE CRISTI	100%	100%	100%	0%	0%	0%
18	VALVERDE	100%	100%	100%	50%	0%	0%
19	ESPAILLAT	100%	100%	100%	50%	0%	0%
20	HERMANAS MIRABAL	100%	100%	100%	50%	0%	0%
21	SAN JOSÉ DE OCOA	100%	100%	100%	50%	25%	0%
22	AZUA	100%	100%	100%	50%	0%	0%
23	DUARTE	100%	100%	100%	50%	25%	25%
24	LA VEGA	100%	100%	100%	50%	25%	0%
25	PUERTO PLATA	100%	100%	100%	50%	25%	0%
26	MARÍA TRINIDAD SANCHEZ	100%	100%	80%	50%	0%	0%
27	PERAVIA	100%	100%	100%	50%	25%	0%
28	SAN CRISTÓBAL	100%	100%	100%	50%	25%	0%
29	LA ROMANA	100%	100%	100%	50%	25%	0%
30	DISTRITO NACIONAL	100%	100%	50%	50%	0%	0%
31	SANTO DOMINGO	100%	100%	50%	50%	0%	0%
32	SANTIAGO	100%	80%	50%	50%	0%	0%

Fuente: Informe trimestral del Departamento de Cartografía de la ONE.
