

Plan Operativo Anual POA 2016

Informe No. 2 Seguimiento y Evaluación

Abril-Junio

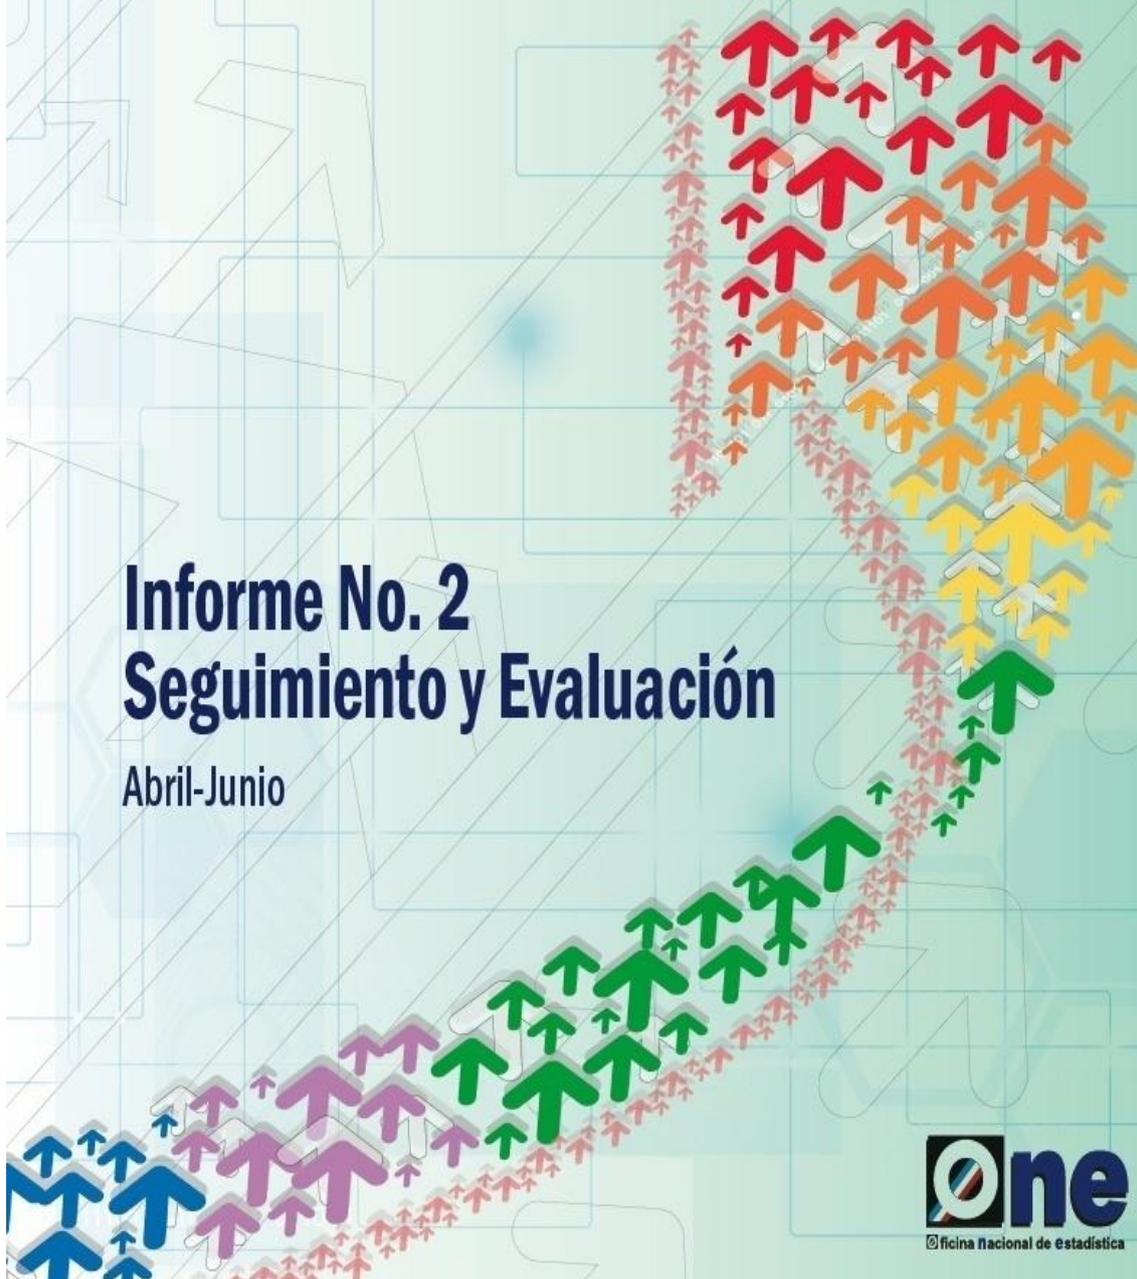


Tabla de Contenido

A. Introducción	3
B. Análisis de la información.....	4
1. Estructura del Plan Operativo Anual.....	4
1.1 Estructura de objetivos, productos y subproductos.....	4
2. Tiempo	5
2.1 Resumen del estatus institucional por objetivo	5
2.2 Resumen del estatus institucional por producto.....	7
2.3 Estado de productos y subproductos por objetivo general	12
2.4 Categoría de productos y subproductos en ejecución, programados y detenidos por objetivo general	13
2.5 Cumplimiento Operacional de productos y sub productos por área responsable	14
3. Alcance	16
3.1 Entregables completados por el producto.....	16
4. Costos.....	21
5. Operaciones no planificadas	24
6. Riesgos.....	25
7. Satisfacción del usuario/Comunicaciones	25
8. Recursos	27
C. Resultados	29
1. Cuantitativo	29
2. Cualitativo.....	29
D. Recomendaciones	30
Anexo 1. Política de Seguimiento y Evaluación del POA.....	31

A. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2016 corresponde al tercer año de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017 de la Oficina Nacional de Estadística.

La estructura de este POA 2016 es similar a la de los planes operativos anuales precedentes. Es decir, a partir de los cinco grandes objetivos generales del PEI 2014-2017 y de los objetivos específicos identificados para alcanzar cada uno de ellos, se van describiendo aquellos productos estratégicos y operativos que se han planificado realizar durante este año.

Es oportuno señalar que la mayoría de los productos del POA 2016 tienen un carácter plurianual, es decir, figuran productos que iniciaron durante el 2014, 2015 y otros que inician en este año.

El **Informe No. 2 de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2016** corresponde al período **enero-junio**. Su contenido está basado en los insumos suministrados por las distintas áreas que conforman la institución en cuanto a alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, comunicaciones, satisfacción de usuarios y recursos humanos.

El **objetivo general** de este informe es presentar el análisis, resultados y recomendaciones de la ejecución correspondiente al segundo trimestre del año, con la finalidad de que su contenido sea socializado en equipo en las áreas para su revisión, reflexión y fortalecimiento de la gestión del POA.

A continuación los principales **objetivos específicos** del informe:

- Presentar el avance de la ejecución al 30 de junio, a través de la variable Índice de Cumplimiento (ICO), a nivel de producto, resultado y de la institución en general
- Presentar los entregables completados de productos y subproductos en el período abril-junio
- Presentar el estatus de las operaciones completadas y no planificadas en el POA
- Dar estatus del presupuesto programado, ejecutado y disponible al corte de este informe
- Presentar los nuevos riesgos identificados, asociados a los productos del POA
- Presentar otros esfuerzos y actividades realizadas en los renglones de satisfacción de usuarios, comunicaciones y recursos, correspondientes al segundo trimestre

B. Análisis de la información

1. Estructura del Plan Operativo Anual


El Plan Operativo Anual (POA) 2016 de la institución está conformado por las siguientes unidades estructurales: objetivos generales (5), objetivos específicos (15), productos (62) y subproductos (193).

1.1 Estructura de objetivos, productos y subproductos

Cuadro 1.1 Estructura objetivos, productos y subproductos

Objetivo general	Objetivo específico	Producto	Subproducto
Total	15	62	193
OG1	3	6	24
OG2	2	26	90
OG3	4	8	20
OG4	2	5	15
OG5	4	17	44

Gráfico 1.1 Distribución de objetivos específicos, productos y subproductos por objetivo general

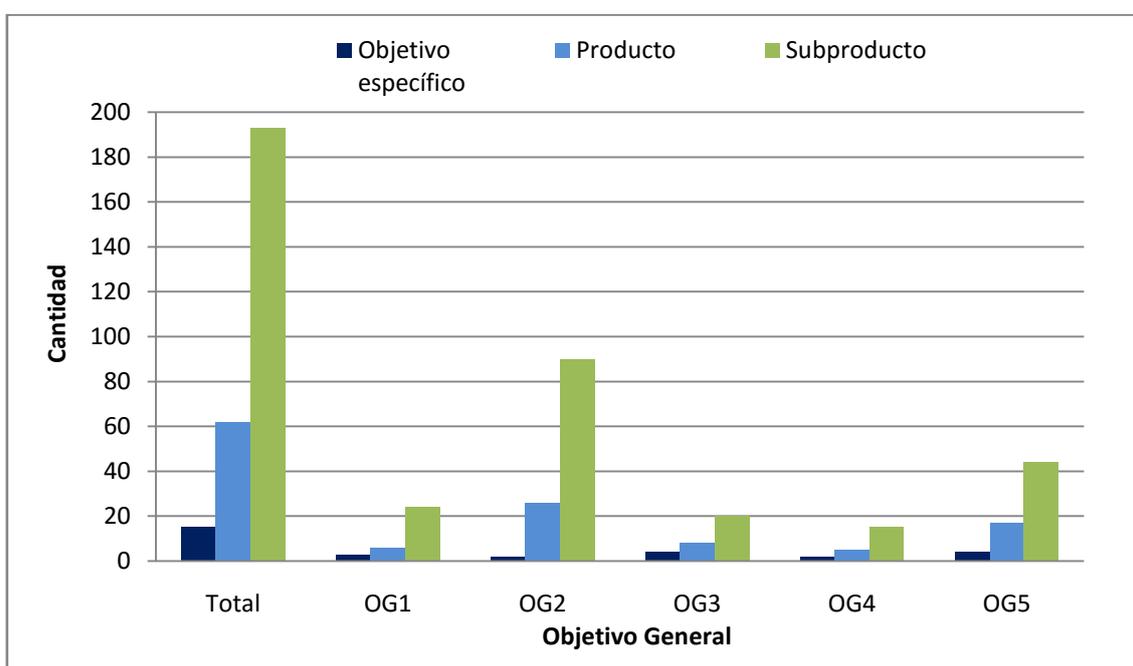

2. Tiempo

2.1 Resumen del estatus institucional por objetivo

En el siguiente cuadro, se presenta el avance obtenido al 30 de junio 2016, de los **objetivos generales y específicos** del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017.

Leyenda: Nivel escala del Cumplimiento Operacional:

● = Alto (80 - 100) ● = Medio (60 - 79) ● = Bajo (0 - 59) ● = Programado ● = Detenido

Cuadro 2.1 Resumen estatus institucional por objetivos generales y específicos

Objetivo General/Objetivo específico	Cumplimiento %	Categoría
02.1. Plan Operativo Anual (POA) 2016 R1.0	82.88●	Alto
1. OBJETIVO GENERAL 1: Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	75.04●	Medio
1.1. Fortalecer la integración del Sistema Estadístico Nacional mediante la implementación de normas y estándares nacionales e internacional	91.34●	Alto
1.2. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN	83.33●	Alto
1.3. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN	50.45●	Bajo
2. OBJETIVO GENERAL 2: Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades del Sistema Nacional de Planificación	87.27●	Alto
2.1. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de decisiones alineados con el SNPIP	87.27●	Alto
2.2. Asegurar la información territorial desagregada en la producción estadística de la ONE	- ●	Detenido
3. OBJETIVO GENERAL 3: Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso	74.35●	Medio
3.1. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional	93.75●	Alto
3.2. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de datos, metadatos e informaciones estadísticas	91.06●	Alto
3.3. Crear el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y de conocimiento de sus necesidades	23.08●	Bajo
3.4. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e internacional	89.50●	Alto

Objetivo General/Objetivo específico	Cumplimiento %	Categoría
4. OBJETIVO GENERAL 4: Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	85.20 ●	Alto
4.1. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de visibilización de grupos vulnerables	73.33 ●	Medio
4.2. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	97.06 ●	Alto
5. OBJETIVO GENERAL 5: Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada	92.56 ●	Alto
5.1. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en alcance, costo, tiempo y calidad	91.63 ●	Alto
5.2. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y desarrollo del talento humano	78.60 ●	Medio
5.3. Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica de la ONE e incrementar su impacto en la productividad de todas las áreas	100 ●	Alto
5.4. Fortalecer la gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional	100 ●	Alto

2.2 Resumen del estatus institucional por producto

En el siguiente cuadro se presenta el avance obtenido al 30 de junio del 2016 de los **productos** del Plan Estratégico 2014-2017.

Leyenda: Nivel escala del Cumplimiento Operacional:

● = Alto (80 - 100) ● = Medio (60 - 79) ● = Bajo (0- 59) ● Programado ● Detenido

Cuadro 2.2 Resumen estatus institucional por productos

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
04.1. Plan Operativo Anual (POA) 2016 R1.0	82.88 ●	Alto	
1. Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	75.04 ●	Medio	
1.1. Fortalecer la integración del Sistema Estadístico Nacional mediante la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales	91.34 ●	Alto	
1.1.01. Plan Estadístico Nacional (PEN) implementado	91.07 ●	Alto	Coordinación Estadística
1.1.03. Marco normativo de la producción estadística del SEN implementada	89.86 ●	Alto	Coordinación Estadística
1.1.04. Programa de Capacitación Estadística para el personal de la ONE y el resto del SEN formulado e implementado	93.08 ●	Alto	Escuela Nacional de Estadística
1.2. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN	83.33 ●	Alto	
1.2.01. Ley que crea el SEN aprobada	83.33 ●	Alto	Dirección Nacional
1.3. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN	50.45 ●	Bajo	
1.3.01. Manual de funciones de los departamentos de estadística de las instituciones y organismos del Estado diseñado en coordinación con el MAP	50.45 ●	Bajo	Recursos Humanos
1.3.02. Política de difusión de la producción estadística del SEN formulada e implementada	- ●	Programado	Coordinación Estadística
2. Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y demás prioridades nacionales	87.27 ●	Alto	
2.1. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de decisiones alineados con el SNPIP	87.27 ●	Alto	

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
2.1.01. Base de datos cartográfica actualizada con procesos definidos e implementados	86.68 ●	Alto	Cartografía
2.1.07. Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) realizado	100.00 ●	Alto	Censos
2.1.08. Sistema de Encuestas de Hogares ampliado y mejorado	64.20 ●	Medio	Encuestas
2.1.09. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2016-2017	- ●	Programado	Encuestas
2.1.11. Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) ampliado y mejorado	100.00 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.12. Proyecciones de Población realizadas	86.67 ●	Alto	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.13. Sistema de Estadística para la Medición de Bienestar implementado	81.71 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.14. Sistema de Encuesta de Actividad Económica Ampliado y Mejorado	87.70 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.15. Sistema de estimación de índices económicos actualizados	91.98 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.17. Programa de investigación y metodología utilizando información existente	88.33 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
2.1.18. Programa estadístico territorial diseñado e implementado	75.21 ●	Medio	Oficinas Territoriales
2.1.19. Plan de producción estadística de la ONE definido y actualizado	100.00 ●	Alto	Planificación y Desarrollo
2.1.21. Registro Nacional de Establecimientos (RNE)	86.43 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.22. Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	- ●	Programado	Encuestas
2.1.23. Publicaciones de análisis Geo estadístico	95.00 ●	Alto	Cartografía
2.1.24. Adaptación nacional de clasificadores internacionales	100.00 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.25. Anuarios, Compendios y publicaciones periodísticas- Estadísticas Económicas	92.50 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.26. Anuarios, Compendios y publicaciones periodísticas- Estadísticas Sociales y Demográficas (socio demográfico)	- ●	Programado	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.27. Repositorio único de estadísticas e indicadores fortalecido	86.03 ●	Alto	Tecnología de la Información

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
2.1.28. Sistema de Indicadores para la Planificación Social y Económica (SINID)	82.47 ●	Alto	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.29. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020	57.97 ●	Bajo	Censos
2.1.30. Perfil de Empresas exportadoras e importadoras	94.96 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.31. Informe País Hábitat III	87.50 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
2.1.41. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área económica	98.75 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.42. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área Demográfica	76.48 ●	Medio	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.2. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional	- ●	Detenido	
2.2.01. Indicadores con perspectiva territorial calculados	- ●	Detenido	Oficinas Territoriales
3. Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso	74.35 ●	Medio	
3.1. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional	93.75 ●	Alto	
3.1.01. Programa de promoción y formación de la cultura estadística en la República Dominicana definido e implementado	93.75 ●	Alto	Comunicaciones
3.2. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de datos, metadatos e informaciones estadísticas	91.06 ●	Alto	
3.2.01. Plan de fortalecimiento para el acceso a la información estadística implementado	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
3.2.02. Centro de Documentación funcionando con estándares de calidad	94.59 ●	Bajo	Comunicaciones
3.2.03. Plan de capacitación a usuarios clave formulado e implementado	- ●	Detenido	Escuela Nacional de Estadística
3.2.04. Difusión de estadísticas TIC a través del Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (OSIC-RD)	78.57 ●	Medio	Dirección Nacional
3.3 Crear el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y de conocimiento de sus necesidades	23.08 ●	Bajo	Comunicaciones
3.3.01. Sistema de evaluación para conocer las necesidades y la satisfacción de los usuarios implementado para todas las áreas	23.08 ●	Bajo	Comunicaciones

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
3.4. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e internacional	89.50 ●	Alto	Comunicaciones
3.4.01. Plan de Comunicación formulado e implementado	99.00 ●	Alto	Comunicaciones
3.4.02. Institución posicionada en el ámbito internacional	80.00 ●	Alto	Dirección Nacional
4. Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	85.20 ●	Alto	
4.1. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de visibilización de grupos vulnerables	73.33 ●	Medio	
4.1.01. Política y normas de gestión humana e institucional con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables definidas e implementadas	46.67 ●	Bajo	Recursos Humanos
4.1.02. Actividades internas de sensibilización implementadas	100.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
4.2. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	97.06 ●	Alto	
4.2.01. Políticas y normas de producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	100.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
4.2.02. Plan de seguimiento a la implementación de las políticas y las normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos	- ●	Programado	Metodología e Investigaciones
4.2.04. Producción de información con enfoque de género mejorada	94.13 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
5. Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada	92.56 ●	Alto	
5.1. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en alcance, costo, tiempo y calidad	91.63 ●	Alto	
5.1.01. Sistema integrado de planificación y control de gestión implementado	81.15 ●	Alto	Planificación y Desarrollo
5.1.02. Metodología definida e implementada para gestionar la realización de los censos nacionales y otros productos priorizados	- ●	Programado	Planificación y Desarrollo
5.1.03. Sistema integrado de gestión administrativa financiera implementado	84.17 ●	Alto	Administrativo y Financiero

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
5.1.04. Sistema de gestión de la cooperación internacional implementado	98.61 ●	Alto	Cooperación Internacional
5.1.05. Sistema de gestión de calidad implementado	100.00 ●	Alto	Calidad en la Gestión
5.1.06. Plan de mejoras asociado al Código Regional de Buenas Prácticas (CRBP)	100.00 ●	Alto	Calidad en la Gestión
5.1.07. Comunicación interna fortalecida	81.77 ●	Alto	Comunicaciones
5.1.08. Plataforma de Seguimiento de Solicitudes a Comunicaciones	- ●	Detenido	Comunicaciones
5.1.09. Coordinación de eventos fortalecida	95.74 ●	Alto	Comunicaciones
5.2. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y desarrollo del talento humano	78.60 ●	Medio	
5.2.01. Sistema integrado de gestión humana con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables implementado	68.08 ●	Medio	Recursos Humanos
5.2.02. Estructura organizativa enfocada en los procesos implementada	- ●	Detenido	Recursos Humanos
5.2.03. Programa de gestión del cambio implementado	95.00 ●	Alto	Recursos Humanos
5.2.04. Gestión de la Escuela Nacional de Estadística (ENE) fortalecida	72.73 ●	Medio	Escuela Nacional de Estadística
5.3. Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica de la ONE e incrementar su impacto en la productividad de todas las áreas	100.00 ●	Alto	
5.3.01. Infraestructura tecnológica fortalecida	100.00 ●	Alto	Tecnología de la Información
5.3.02. Sistema de gestión de servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	- ●	Detenido	Tecnología de la Información
5.3.03. Sistema de gestión de la seguridad de la información implementado	100.00 ●	Alto	Tecnología de la Información
5.4. Fortalecer la gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional	100.00 ●	Alto	
5.4.01. Gestión legal fortalecida	100.00 ●	Alto	Jurídico

2.3 Estado de productos y subproductos por objetivo general

A continuación, se presentan los datos correspondientes al Cumplimiento Operacional de productos y subproductos por objetivo general. (Cuadros 2.3.1 y gráficos 2.3.1 y 2.3.2).

Cuadro 2.3.1 Estado cumplimiento operacional de productos y subproductos por objetivo general

Objetivo General	Producto						Sub Producto					
	Total	Alto	Medio	Bajo	Programado	Detenido	Total	Alto	Medio	Bajo	Programado	Detenido
Total	62	41	6	4	6	5	193	117	18	17	21	20
OG1	6	4		1	1		24	14	4	1	3	2
OG2	26	18	3	1	3	1	90	58	10	7	9	6
OG3	8	5	1	1		1	20	12	1	1	2	4
OG4	5	3		1	1		15	6	1	2	5	1
OG5	17	11	2		1	3	44	27	2	6	2	7

Gráfico 2.3.1 Estado producto por objetivo general


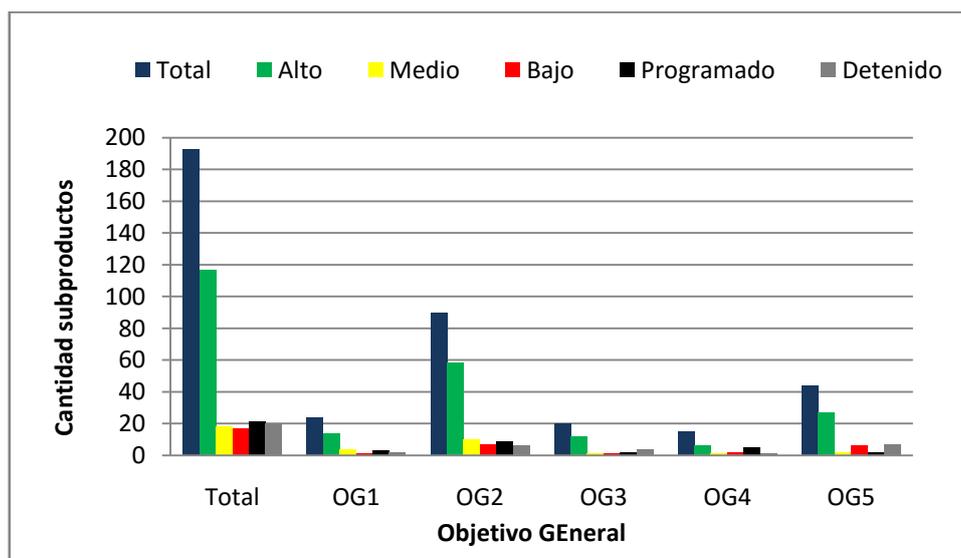


Gráfico 2.3.2 Estado subproducto por objetivo general

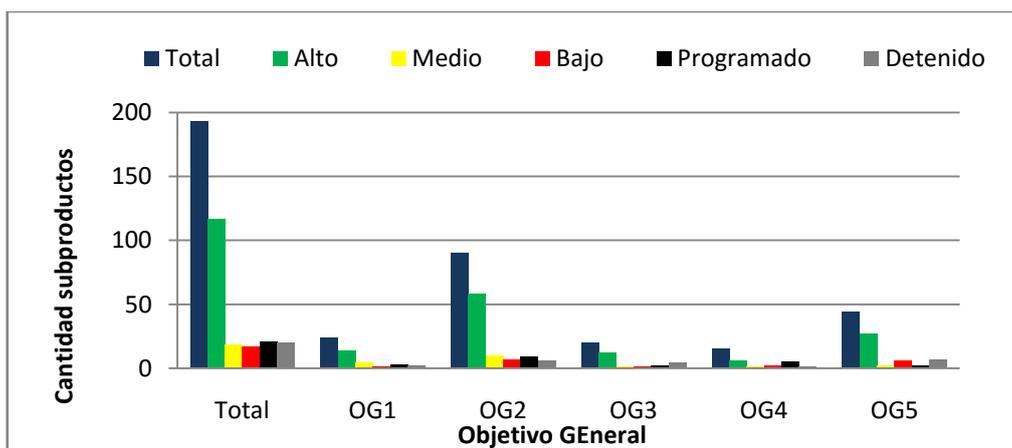

2.4 Categoría de productos y subproductos en ejecución, programados y detenidos por objetivo general

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la categorización de productos y subproductos por objetivo general (cuadro 2.4 y gráficos 2.4.1 y 2.4.2).

Cuadro 2.4 Categorización de productos y subproductos en ejecución, programados y detenidos por objetivo general

Objetivo General	Producto								Sub Producto							
	Total		En ejecución		Programado		Detenido		Total		En ejecución		Programado		Detenido	
Total	62	100%	51	82%	6	10%	5	8%	193	100%	152	79%	21	11%	20	10%
OG 1	6	10%	5	83%	1	17%	0	0%	24	12%	19	79%	3	13%	2	8%
OG 2	26	42%	22	85%	3	12%	1	4%	90	47%	75	83%	9	10%	6	7%
OG 3	8	13%	7	88%	0	0%	1	13%	20	10%	14	70%	2	10%	4	20%
OG 4	5	8%	4	80%	1	20%	0	0%	15	8%	9	60%	5	33%	1	7%
OG 5	17	27%	13	76%	1	6%	3	18%	44	23%	35	80%	2	5%	7	16%

Gráfico 2.4.1 Categorización de productos ejecutados y programados por objetivo general


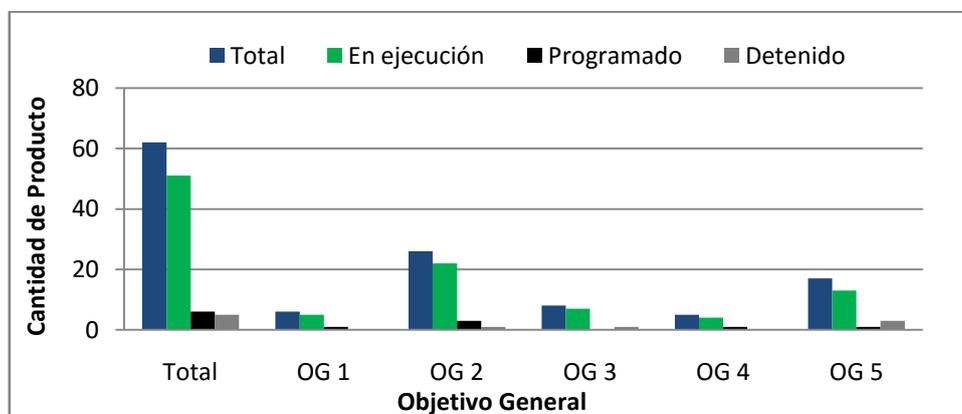


Gráfico 2.4.2 Relación subproductos ejecutados y programados

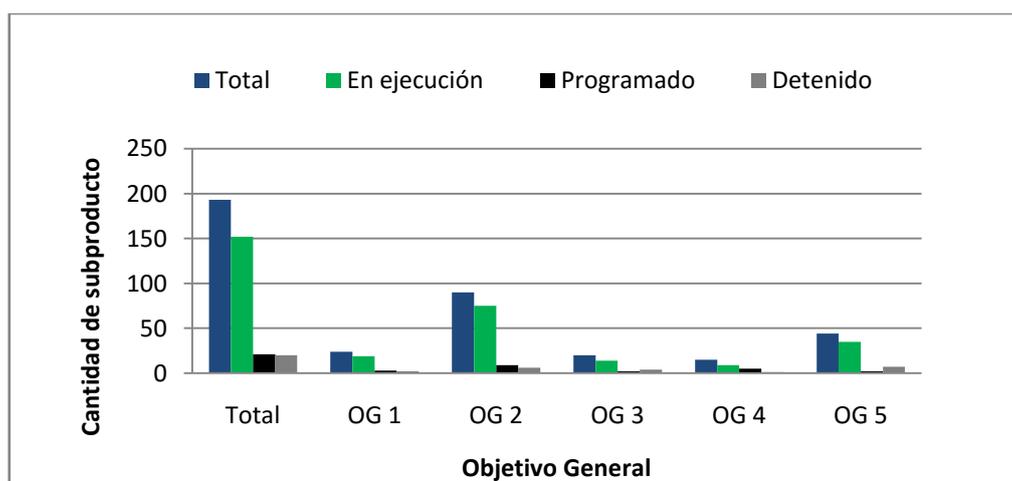

2.5 Cumplimiento Operacional de productos y sub productos por área responsable

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la categorización de productos y subproductos por objetivo general y el cumplimiento operacional de productos y subproductos por área responsable (cuadros 2.5.1 y 2.5.2).

Cuadro 2.5.1 Nivel de cumplimiento operacional de productos por área responsable

Área	Total		Alto		Medio		Bajo		Programado		Detenido	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Dirección Nacional	3	5	2	67	1	33						
Planificación y Desarrollo	5	8	4	80					1	20		
Censos	2	3	1	50			1	50				
Encuestas	3	5			1	33			2	67		
Estadísticas Económicas	9	15	9	100								
Estadísticas Demográficas	4	6	2	50	1	25			1	25		
Oficinas Territoriales	2	3			1	50					1	50
Coordinación Estadística	3	5	2	67					1	33		
Metodología e Investigaciones	6	10	5	83					1	17		
Cartografía	2	3	2	100								
Comunicaciones	8	13	6	75			1	13			1	13
Escuela Nacional de Estadística	3	5	1	33	1	33					1	33
Recursos Humanos	5	8	1	20	1	20	2	40			1	20
Tecnología de la Información	4	6	3	75							1	25
Administrativo y Financiero	1	2	1	100								
Cooperación Internacional	1	2	1	100								
Jurídico	1	2	1	100								
Total	62	100	41	66	6	10	4	6	6	10	5	8

Cuadro 2.5.2 Nivel de cumplimiento operacional de subproductos por área responsable

Área	Total		Alto		Medio		Bajo		Programado		Detenido	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Dirección Nacional	8	4	5	63	1	13			2	25		
Planificación y Desarrollo	15	8	9	60	1	7	2	13	2	13	1	7
Censos	3	2	2	67			1	33				
Encuestas	5	3	1	20	1	20	1	20	2	40		
Estadísticas Económicas	46	24	37	80	4	9			2	4	3	7
Estadísticas Demográficas	17	9	9	53	2	12	2	12	4	24		
Oficinas Territoriales	5	3	1	20	1	20	2	40			1	20
Coordinación Estadística	17	9	11	65	3	18			2	12	1	6
Metodología e Investigaciones	16	8	8	50	1	6			5	31	2	13
Cartografía	3	2	2	67	1	33						
Comunicaciones	12	6	9	75			1	8	1	8	1	8
Escuela Nacional de Estadística	12	6	4	33	1	8	1	8	1	8	5	42
Recursos Humanos	16	8	5	31	2	13	5	31			4	25
Tecnología de la Información	9	5	6	67			1	11			2	22
Administrativo y Financiero	5	3	4	80			1	20				
Cooperación Internacional	3	2	3	100								
Jurídico	1	1	1	100								
Total	193	100	117	61	18	9	17	9	21	11	20	10

3. Alcance

3.1 Entregables completados por el producto

En este renglón se incluirán los entregables completados en el segundo trimestre de los productos planificados

2.1.07. Censo Nacional Agropecuario

- Informe de resultados definitivos Precenso
- Presentación resultados Precenso

2.1.08. Sistema de Encuestas de Hogares ampliado y mejorado (ENHOGAR)

- Informe final de resultados final ENHOGAR-MICS 2014

2.1.11. Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) ampliado y mejorado

- Mejoras en el aplicativo de captura y actualización del DEE realizadas
- Creación de la sección del DEE en la página web.

2.1.12. Proyecciones de Población realizadas

- Volumen IV: Proyecciones sub nacionales de población 2000-2030 publicado

2.1.13. Sistema de Estadística para la Medición de Bienestar implementado

- Borrador del estudio de Impacto de las Micro finanzas en el Bienestar Social elaborado; pendiente difusión
- Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria a Octubre 2015 elaborado; pendiente difusión
- Rediseño de la sección de Pobreza, calidad de vida y bienestar en la página web

2.1.14. Sistema de Encuesta de Actividad Económica (ENAE)

- Creación de la sección en la página web de la ENAE
- Consultoría para diseño ENAE 2016 y adopción de los clasificadores.

2.1.15. Sistema de estimación de índices económicos actualizados

- Boletín Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)- Marzo, Abril y Mayo 2016
- Series históricas del ICDV de enero 2012 a Mayo 2016 publicadas en web
- Boletín de resultados del Índice de Precios del productor (IPP) Manufactura - Marzo, Abril y Mayo 2016
- Boletín de resultados del Índice de Precios del productor (IPP) servicios - Marzo, Abril y

Mayo 2016

- Series históricas del IPP de diciembre 2013 a Mayo 2016 publicadas en web.
- Ponderaciones del IPP actualizadas a Mayo 2016 publicadas en web
- Infografías del IPP y el ICDV de Marzo, Abril y Mayo 2016 publicadas en la Web y Redes sociales.
- Notas de prensas del IPP y el ICDV de Marzo, Abril y Mayo 2016 publicadas en web y enviada a la prensa

2.1.17. Programa de investigación y metodología utilizando información existente

- Metodología para la identificación de tugurios en el Distrito Nacional 2010 elaborada
- Monografía “Envejecimiento Demográfico como desafío al Sistema de Seguridad Social” publicado
- Monografía “Perspectivas de la Educación Media en la República Dominicana
- Boletín Panorama Estadístico #81 “Lactancia materna en RD, indicadores ENHOGAR-MICS-2014
- Boletín Panorama Estadístico #82 “Representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones”

2.1.18. Programa estadístico territorial diseñado e implementado

- Presentación a la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) de los perfiles turísticos de las provincias de La Romana, La Altagracia
- Perfiles provinciales Yuma – Higuamo corregidos y publicados en web. Pendiente impresión.
- Nuevo mobiliario para la oficina territorial La Altagracia (Credensa, sillas, mesa de visitas, silla de visitas, escritorio, armario, etc.)
- Borrador del protocolo de confidencialidad elaborado.
- Implementación encuesta de satisfacción a usuarios en las oficinas provinciales

2.1.19. Plan de producción estadística de la ONE definido y actualizado

- PPI 2016-2025 actualizado

2.1.21. Registro Nacional de Establecimientos (RNE)

- Boletines RNE Elías Piña, Monte Cristi, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Pedernales, San Pedro de Macorís y Santo Domingo publicados
- Boletines con datos preliminares del RNE Santiago, Duarte, Puerto Plata, Samaná.
- Presentación de resultados RNE San Pedro de Macorís.

2.1.27. Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido

- Carga y validación de la base de de micro datos de construcción 2015
- Reportes de la base de datos de construcción desplegados
- Carga en la DWH de la base de micro datos de transporte marítimo y aéreo
- Reportes de la base de datos de transporte marítimo y aéreo desplegados

2.1.30. Perfil de Empresas exportadoras e importadoras

- Informe de los resultados de la validación bases de datos aduanales 2014 y 2015
- Informe de los resultados del cruce de aduanas 2014 con bases de datos de empresas.

2.1.31. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020

- Informe país Habitat III elaborado

2.1.41. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área económica

- Anuario Estadística de Comercio Exterior 2015
- Boletín No. 6. Gestión MYPYME
- Rediseño de la sección de construcción en la página web.
- Base de datos validada y procesada y cuadros actualizado y cargados en web al 1T 2016, de los sectores: transporte, construcción, comunicación, turismo, Finanzas públicas gobierno central, mercado asegurador, bolsa de valores, intermediarios financieros, macroeconómicos, tasa de cambio, deuda externa, industria, agrícolas y pecuario, electricidad, Agua, Consumo de Combustible, empleo en las zonas francas, comercio exterior

2.1.42. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área demográfica

- Compendio de Estadísticas vitales 2010-2014 publicado
- Anuario de Estadísticas Socio demográficas 2014 publicado
- Compendio de estadísticas de muertes accidentales y violentas 2006-2014 publicado
- Informe Indicadores básicos de mercado laboral en RD de acuerdo con la nueva metodología de la CIET 19 publicado en web

3.1.01. Programa de promoción y formación de la cultura estadística

- Concurso y entrega de premio a la propuesta ganadora del diseño del Portal Didáctico de Estadística.
- Visitas técnicas especializadas en estadística a los periódicos Listín Diario y el Caribe

3.2.01. Plan de fortalecimiento para el acceso a la información estadística implementado

- ENE virtual rediseñada
- ONE versión Móvil implementada
- Modificaciones realizadas a las siguientes secciones del sitio web: Transparencia, Pobreza, DEE, ENAE, Publicaciones, Manufactura
- Informe trimestral analíticas del sitio web elaborado

3.2.02. Centro de Documentación funcionando con estándares de calidad

- Visita de los alumnos del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, de Salcedo
- Visita del Politécnico de Pedro Francisco Bonó, de Maimón, Provincia Monseñor Nouel
- Visita de estudiantes de Estadística Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
- Fumigación para preservar las colecciones realizada
- 12 libros y 14 mapas cartográficos del 2002 digitalizados
- 105 Solicitudes atendidas a través del CENDOC y 31 a través de las oficinas provinciales

3.4.01. Plan de Comunicaciones

- Memoria Institucional elaborada
- Revista ONE no. 12 publicada
- XXXV Encuentro Interinstitucional del Sistema Estadístico Nacional
- 2 infografías para medios impresos y digitales (animadas) diseñadas :
 - Las niñas y adolescentes dominicanas: síntesis del compendio para la planificación social con enfoque de género en favor de la niñez.
 - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2014).
- Matriz de los mensajes a difundir en las diferentes Redes Sociales elaborada
- 7 efemérides realizadas
- Informe 2T con las métricas de redes sociales elaborado

3.4.02. Institución posicionada en el ámbito internacional

- Participación en la XV reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
- Participación en la reunión de la OCDE y la CEPAL sobre el Bienestar en América Latina y el Caribe
- Participación en la reunión semestral de la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD)

4.2.01. Políticas y normas de producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables

- Propuesta de la política elaborada

4.2.04. Producción de información con enfoque de género mejorada

- Propuesta conceptual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género diseñada
- Hojas informativas sectores Salud, Economía y Trabajo elaboradas

5.2.01. Sistema de planificación y control de gestión implementado

- POA 2016 socializado con encargados
- POA 2016 formulado publicado en intranet
- Informe de seguimiento y evaluación POA 2016-1T
- Resumen Ejecutivo CNPV 2020 formulado, revisado y enviado a IP Resumen ejecutivo PFI formulado, revisado y enviado en Junio 2016 a Banco Mundial

- Matriz de Demanda de la CI con los productos del PPI 2017-2026
- Estructura del Modelo POA 2017 cargada en Delphos
- Matriz de lecciones aprendidas en la implementación de Delphos actualizada
- Matriz de presupuestación POA 2016 completada

5.1.03. Sistema integrado de gestión administrativa financiera implementado

- Módulos de reportes implementado
- Desarrollo módulo de control presupuestario por código POA en el SIGIF
- Presupuesto a nivel de código POA cargado en el SIGIF
- Módulo de control presupuestario a nivel de objeto implementado
- Presupuesto distribuido por objeto
- Matriz Ambiente de Control Principios I al V de las normas de control interno completada

5.1.04. Sistema de gestión de la Cooperación Internacional

- Formulario de Seguimiento presupuestal de los fondos de Cooperación Internacional diseñado
- Formulario de Seguimiento de los servicios de consultoría financiados con fondos de la Cooperación Internacional diseñado
- Levantamiento de información para diagnóstico situacional de la Cooperación nacional con: División de Articulación Sectorial, Departamento de Comunicaciones, Dirección de Estadísticas Continuas, Departamento de Tecnología y División de Investigaciones.

5.1.05. Sistema de gestión de calidad implementado

- Informe de las mejoras identificadas en el Departamento Jurídico elaborado
- Informe de auditoría al procedimiento del CENDOC

5.2.01. Sistema integrado de gestión humana con enfoque de género

- Capacitación en SQL, Cortesía telefónica, Charla de Ética, Prevención y concientización sobre conflictos de intereses en la Administración Pública, entre otros.
- Celebración día de la Secretaria
- Charlas de salud preventiva, operativo médico
- Plan de promoción y prevención de la Salud diseñado
- Celebración día de las madres

5.3.01. Infraestructura tecnológica fortalecida



- Renovación Soporte del Sistema DELPHOS
- Renovación Soporte McAfee Endpoint Protection - Advanced SuiteProtectPLUS 1yr Gold Software Support251-500 Nodes
- Renovación Soporte Firewall UTM Watchguard XTM 1150 – Sede
- Renovación soporte Firewall UTM Watchguard XTM 33 - Oficina Provincial Santiago
- Renovación garantía extendida Central Telefónica

4. Costos

En este renglón se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre, por fuente de financiamiento.

Ejecución Presupuestaria

- El **presupuesto planificado** institucional del año 2016 es de RD\$363,725,717.10, siendo el **monto ejecutado** al segundo semestre RD\$138,866,656.27(38%)
- El **presupuesto planificado** de *Gasto Corriente* es de RD\$339,789,227.00 (94%), siendo el **monto ejecutado** al segundo semestre de RD\$132,514,093.90 (39%)
- El **presupuesto planificado** de la *Cooperación Internacional* es de RD\$12,000,621.31 (3%), siendo el **monto ejecutado** RD\$917,885.95 (8%). Para la *Cooperación Nacional*, se tiene un **presupuesto planificado** de RD\$11,935,868.79 (3%) y un **monto ejecutado** de RD\$5,434,676.42 (46%)

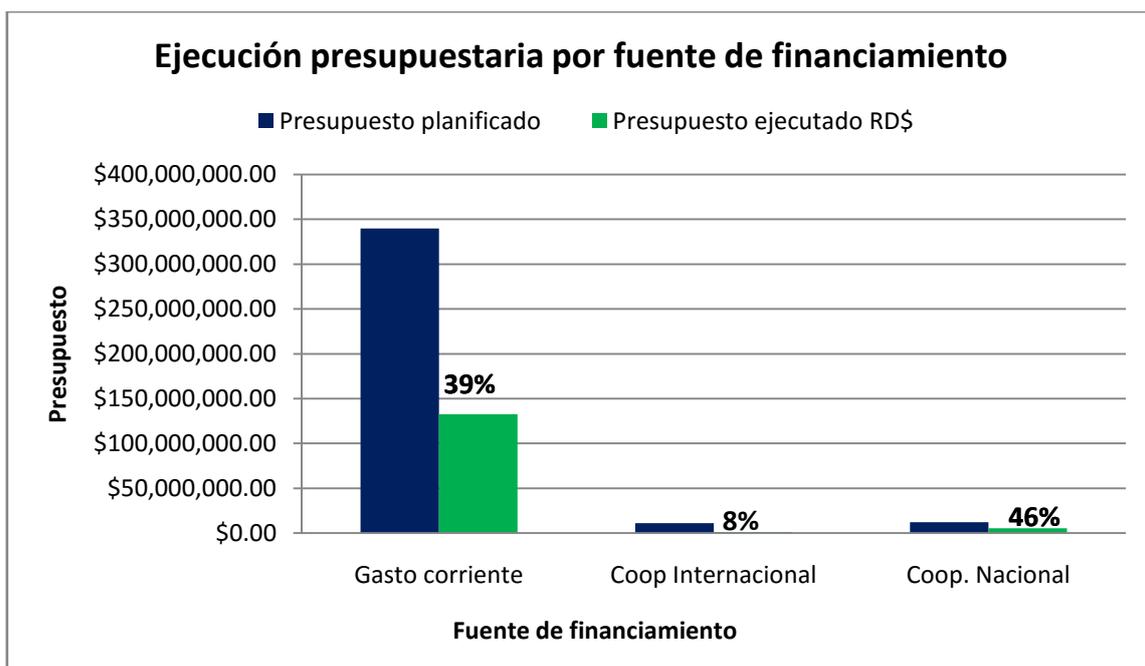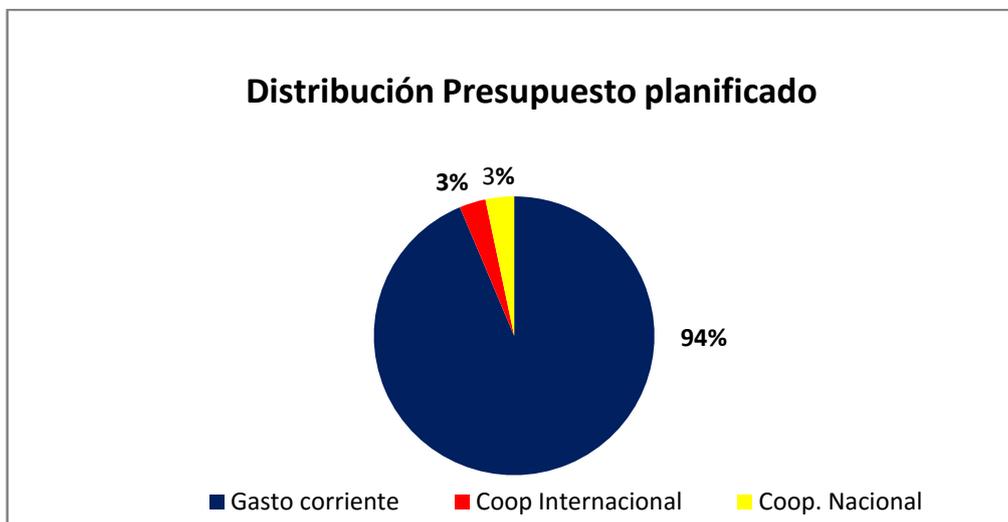



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA



Reporte General del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Desde: Viernes del 01 enero del 2016 **Hasta:** Jueves 30 de junio del 2016
 Generado el: viernes 09 de septiembre del 2016

Código POA	Descripción	Inicial					Ejecutado				
		Gasto Corriente (RD\$)	Inversión Pública (RD\$)	Cooperación Nacional (RD\$)	Cooperación Internacional (RD\$)	Total (RD\$)	Gasto Corriente (RD\$)	Inversión Pública (RD\$)	Cooperación Nacional (RD\$)	Cooperación Internacional (RD\$)	Total (RD\$)
Total		339,678,194.96	0.00	11,935,868.79	12,000,621.31	363,614,685.06	132,514,093.90	0.00	5,434,676.42	917,885.95	138,866,656.27
1.1.04.	Programa de Capacitación Estadística para el personal de la ONE y el resto del SEN formulado e implementado	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.	Ley que crea el SEN aprobada	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.	Manual de funciones de los departamentos de estadística de las instituciones y organismos del Estado diseñado en coordinación con el MAP	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.27.	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	1,067,538.03	0.00	0.00	0.00	1,067,538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.03.	Plan de capacitación a usuarios clave formulado e implementado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.04.	Difusión de estadísticas TIC a través de la coordinación del Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (OSIC-RD)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.02.	Institución posicionada en el ámbito internacional	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	840,476.59	0.00	0.00	0.00	840,476.59
4.1.01.	Política y normas de gestión humana e institucional con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables definidas e implementadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código POA	Descripción	Inicial					Ejecutado				
		Gasto Corriente (RD\$)	Inversión Pública (RD\$)	Cooperación Nacional (RD\$)	Cooperación Internacional (RD\$)	Total (RD\$)	Gasto Corriente (RD\$)	Inversión Pública (RD\$)	Cooperación Nacional (RD\$)	Cooperación Internacional (RD\$)	Total (RD\$)
5.2.01.	Sistema integrado de gestión humana con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables implementado	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.	Estructura organizativa enfocada en los procesos implementada	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.	Programa de gestión del cambio implementado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.	Gestión de la Escuela Nacional de Estadística (ENE) fortalecida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.	Infraestructura tecnológica fortalecida	4,569,600.00	0.00	0.00	0.00	4,569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.01.	Nómina Dirección y Coordinación Técnico-Administrativa de la Producción	106,183,589.50	0.00	0.00	0.00	106,183,589.50	45,989,079.40	0.00	0.00	0.00	45,989,079.40
9.1.08.	Control y seguimiento del gasto de servicios generales	21,369,537.54	0.00	0.00	0.00	21,369,537.54	8,580,064.25	0.00	0.00	0.00	8,580,064.25
9.1.50.	Transferencia presupuestaria de la Dirección Nacional a Encuentros Interinstitucionales	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	412,437.98	0.00	0.00	0.00	412,437.98
9.1.09.	Control y seguimiento del gasto no planificado	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	424,221.20	0.00	0.00	0.00	424,221.20
2.1.07.	Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) realizado	0.00	0.00	10,373,197.33	0.00	10,373,197.33	0.00	0.00	5,344,257.64	0.00	5,344,257.64
2.1.08.	Sistema de Encuestas de Hogares ampliado y mejorado	19,263,325.77	0.00	1,468,000.00	984,541.74	21,715,867.51	0.00	0.00	0.00	678,732.24	678,732.24
9.1.02.	Nómina Producción Censos y Encuestas	21,386,326.24	0.00	0.00	0.00	21,386,326.24	10,097,661.98	0.00	0.00	0.00	10,097,661.98

5. Operaciones no planificadas

En este renglón se incluirán las operaciones realizadas en el segundo trimestre que no han sido planificadas en el POA.

Operación	Fecha
Cartografía	
Elaboración de los cartogramas para el informe final del Pre Censo Nacional Agropecuario	05-04-2016
Informe UN – Hábitat III –temas I. Cuestiones demográficas urbanas y desafíos para un nuevo programa urbano y VII indicadores	05-05-2016
Comunicaciones	
Diseño e impresión invitación digital, identificadores, programa, boletines y labels cd's para el XXXV Encuentro Interinstitucional del SEN	12-04-2016
Diseño tarjeta de gratitud para los periodistas	19-04-2016
Diseño arte invitación digital para la presentación de los perfiles provinciales	20-04-2016
Diseño artes para la celebración del día de las secretarías: invitación digital y arte impreso	22-04-2016
Diseño invitación digital, impresión de identificadores, materiales entrega a prensa y rediseño e impresión del programa para la Presentación resultados definitivos Precenso	27-04-2016
Diseño encuesta de satisfacción	27-04-2016
Diseño certificados de aprobación curso de Estadística Básica	03-05-2016
Diseño programas y etiquetas Presentación de los Perfiles Turísticos	04-05-2016
Diseño certificados de aprobación curso de EPI-INFO	10-05-2016
Diseño certificados de aprobación curso de Estructura y Creación de Bases de Datos	10-05-2016
Diseño certificados re reconocimiento rediseño Portal Didáctico de Estadística	10-05-2016
Diseño tarjeta de felicitación e invitación Día de las Madres	23-05-2016
Cooperación Internacional	
Asistencia Técnica del INEGI sobre “Cooperación Internacional”	22-06-2016- 24-06-2016
Asistencia Técnica para el “Diseño de perfil de programa para la presentación de solicitud de financiamiento al Banco Mundial”	27-06-2016- 30-06-2016
Coordinación Estadística	
Sistematización de la demanda y oferta de información nacional, incluyendo los instrumentos de planificación nacional (Estrategia Nacional de Desarrollo –END– y Plan Nacional Plurianual del Sector Público –PNPSP–) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los sectores salud, educación, agropecuario, medio ambiente, económico y seguridad social	15-05-2016
Revisión de propuestas de Base de Datos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	23-06-2016
Propuesta de diseño de Base de Datos para estadísticas de: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y Archivo General de la Nación (AGN)	27/05/2016

Operación	Fecha
Creación del subcomité de trabajo para la mejora de las estadísticas agropecuarias de precios, entre la ONE y el Ministerio de Agricultura	29-06-2016
Investigaciones	
Presentaciones de temas de género a colegios asistentes al CENDOC	Todos los miércoles de abril, mayo y junio
Elaboración y entrega del Cuestionario sobre Investigaciones de Género y Salud al Ministerio de Salud	26-05-2016-31-05-2016
Revisión de matrices de alineación de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	30-05-2016
Planificación y Desarrollo	
Actualizar y controlar procedimientos de Recursos Humanos	01-04-2016
Documentar y controlar las políticas para la implementación de ISO-27000	07-04-2016
Documentar y controlar procedimientos de la División de Nómina	23-05-2016
Diseño de la encuesta de uso de servicio (encuesta de satisfacción de usuario CENDOC)	08-06-2016

6. Riesgos

En este renglón se incluirá cualquier riesgo de **alto** impacto en la ejecución del producto, que pueda representar una amenaza al mismo.

Producto	Subproducto u Operación	Riesgo	Impacto
Cartografía			
Base de datos cartográfica actualizada	Digitalización y Georeferenciación	Frecuente salida del servidor	Retraso en la programación de entrega

7. Satisfacción del usuario/Comunicaciones

Se incluirán informaciones sobre acontecimientos **importantes** asociados a la Institución (reuniones, publicaciones, reconocimientos, eventos, entre otros).

Fecha	Descripción
Cartografía	
27-04-2016	Reunión Técnica/taller para la presentación del proyecto regional Atlas Marino del Caribe Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
20-05-2016	1ra Reunión de trabajo del GMDI (Grupo de Datos e Indicadores) - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
10-06-2016	CAASD-Reunión Técnica – Convenio institucional apoyo en la creación del sistema geográfico de dicha institución
15-06-2016	Reunión con delegación del Centro de Desastres del Pacífico de la Universidad de Hawái, en el marco del proyecto " Evaluación

Fecha	Descripción
	Nacional de Referencia para la Preparación en Caso de Desastres"
16-06-2016	Sistema Nacional de Salud (SNS) – Convenio de trabajo entre ONE Y SNS, para fortalecer la medicina preventiva, para lo cual se generarán las zonas de salud y la sectorización sobre la base cartográfica de la ONE
Coordinación Estadística	
29-04-2016	Reunión CENTROESTAD
Investigaciones	
31-05-2016	Reunión en la DGODT sobre alineación entre la END 2030 y la Agenda de los ODS 2030
09-06-2016	Presentación de las matrices de alineación de los ODS 2030 y la END 2030 para los temas de migración y desarrollo urbano, así como la presentación del Índice de Prosperidad Urbana a diferentes actores claves de la ONE
28-04-2016	Reunión en ONU MUJERES sobre Transversalización de Género en la Gestión
29-04-2016	Presentación Diagnóstico socialización, Transversalización de Género en la producción estadística
Planificación y Desarrollo	
14-04-2016	Asistencia al XXXV Encuentro Interinstitucional del Sistema Estadístico Nacional
20-04-2016	Reunión del Comité Operativo de Seguridad de la Información COSI-ONE
28-04-2016	Presentación de resultados del Pre censo Nacional Agropecuario 2015
05-05-2016	Plan de Promoción y Prevención: Invitación Jornada de Salud
05-05-2016	Asistencia a charla Hipertensión Arterial
10-05-2016	Asistencia a charla Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Dengue, Zika, Chikunguya)
03-06-2016	Asistencia a charla Primeros Auxilios Pediátricos
08-06-2016	Reunión sobre Gestión de proyectos en ONE
23-06-2016	Asistencia a charla Ética e integridad en los servidores públicos
27-06-2016	Mejora en la Prestación de Servicios para un Crecimiento Inclusivo en la República Dominicana
28-06-2016	Asistencia a charla Prevención y concientización sobre conflictos de intereses en la Administración Pública

8. Recursos

En este renglón se presentan las actividades más destacadas no identificadas en el POA 2014, asociadas a recursos humanos, tecnológicos, financieros, adquisiciones, entre otros (capacitaciones, certificaciones, premiaciones, reconocimientos, licencias).

Fecha	Categoría	Descripción
Cartografía		
14-06-2016- 12-07-2016	Capacitación	Curso de Integración de la Información estadística y espacial, usando el software libre QGIS
Coordinación Estadística		
05-04-2016	Taller	Hacia un Sistema Estadístico Integrado basado en Registros Administrativos
14-04-2016	Taller	Presentación de los avances del Plan Estadístico Nacional en el marco del proyecto de bienes públicos regionales del sector medio ambiente
13-05-2016	Taller	levantamiento del Inventario de Operaciones Estadísticas
14-06-2016	Curso	Integración de la información estadística y espacial, usando el software libre QGIS
Investigaciones		
06-06-2016- 10-06-2016	Licencia médica	Una semana de licencia de Chantall Ramírez
04-04-2016	Taller	Instituciones Piloto y el equipo de coordinación, integrado por el Ministerio de la Mujer, el Ministro de la Mujer, MEPYD y ONU MUJERES
15-04-2016	Taller	Transversalización de Género en el Ministerio de la Mujer
25-04-2016- 05-05-2016	Gestión de visado	Gestiones de visa Peruana para la participación en el Seminario de Medición de Violencia Contra la Mujer
10-05-2016- 13-05-2016	Seminario	Participación en el Seminario de Medición de Violencia Contra la Mujer a través de Encuestas
19-05-2016	Taller	La perspectiva de género en las estadísticas agropecuarias y registros nacionales de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe
27-05-2016	Taller	Violencia, discapacidad y género
17-06-2016	Taller	“La autonomía económica de las mujeres en Centroamérica y la República Dominicana ”
Planificación y Desarrollo		
04-04-2016	Taller impartido al Departamento de Comunicaciones	Guía para documentación de procesos (División de Calidad en la Gestión)
06-04-2016 - 13-04-2016	Curso	Planificación Estratégica

Fecha	Categoría	Descripción
15-04-2016	Taller	Instituciones piloto firmantes del acuerdo del 20 de enero del 2016 y la comisión mixta de coordinación para la aplicación de la política transversal del enfoque de igualdad de género
24-05-2016	Taller	Sensibilización y capacitación "Hacia la implementación de una gestión institucional con enfoque de igualdad de género"
08-06-2016	Taller	Invitación a Webinar de Proyectos (virtual)
10-06-2016	Taller	Incendio, evaluación y huracanes (MAP)
10-06-2016	Adquisición de equipo	Diseño y modelo de buzón para la encuesta de satisfacción de usuario en el CENDOC
17-06-2016	Taller	Taller especializado sobre el Sistema Nacional de Compras Públicas

C. Resultados

1. Cuantitativo

El resultado del Cumplimiento Operacional de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del segundo trimestre del año 2016, ha sido de un **82.88%**, correspondiente al nivel alto.

El alcance de la planificación operativa se corresponde con la estructura definida del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017 y otros productos operativos identificados, compuesto por cinco (5) objetivos generales, quince (15) objetivos específicos, sesenta y dos (62) productos y ciento noventa y tres (193) subproductos.

El cumplimiento operacional por nivel de los 62 productos definidos en el POA, tiene la siguiente distribución: Alto-41, Medio-6, Bajo-4, Programado-6 y Detenido-5. A nivel de subproducto, los resultados fueron: Alto-117, Medio-18, Bajo-17, Programado-21 y Detenido-20

Con relación a la ejecución del POA del 2T, el 82% de los productos y el 79% de los subproductos planificados se encuentran *En ejecución*; el 10% de los productos y el 11% de los subproductos en el nivel de *Programado* y el 8% de los productos y el 10% de los subproductos el nivel de *Detenido*.

2. Cualitativo

Debilidades encontradas en el proceso de seguimiento y evaluación

A continuación se destacan las debilidades más importantes evidenciadas durante el seguimiento del 2T del POA 2016:

- Alto porcentaje de subproductos detenidos en las siguientes áreas: Oficinas Territoriales, Recursos Humanos, Escuela Nacional de Estadística y Tecnología de la Información
- Ejecución de un alto número de tareas no planificadas, lo cual trae como consecuencia que se le de prioridad a actividades que no han sido programadas en el POA
- Informe cualitativo con informaciones que no son relevantes. En adición, el mismo no se carga en Delphos
- Información insuficiente de los subproductos asociada a entregables completados y medios de verificación
- Registro de cambio de fechas programadas directamente en Delphos, omitiendo el procedimiento establecido a través del *Formulario de Control de cambios* utilizado para estos fines
- Información recibida de manera incompleta, amerita un proceso repetitivo de revisión y corrección por parte de Planificación y Desarrollo. Especialmente los comentarios asociados al avance de los entregables

D. Recomendaciones

1. Reforzar el cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del POA, presentada en el informe del POA 2016-1T. Ver Anexo 1. *Políticas proceso de Seguimiento y Evaluación del POA*.
2. Documentar los comentarios de las tareas con enfoque en el entregable y/o medios de verificación de la misma.
3. Fortalecer el seguimiento continuo de los planes de acción conjuntamente con las áreas involucradas.
4. Revisar cuidadosamente las informaciones registradas antes de su autorización para efficientizar el proceso posterior de aprobación por Planificación y Desarrollo.

Anexo 1. Política de Seguimiento y Evaluación del POA

1. Las informaciones del avance trimestral de las tareas de los subproductos podrán ser registradas en Delphos dentro de los primeros **15 días** después de la fecha de corte del trimestre.
2. Se elaborará el *Informe cuantitativo* del trimestre con las informaciones registradas en Delphos, y se publicará el primer día laborable del mes posterior al corte.
3. Las *operaciones no planificadas* serán registradas en el formato cualitativo y registradas en Delphos.
4. Los cambios a la planificación establecida serán solicitados mediante el *Formulario de control de cambios* a Planificación y Desarrollo. Entre ellos: reprogramaciones, inclusión de una tarea, detención de una operación, alcance de entregables, medios de verificación.
5. Los cambios solicitados a través del *Formulario de control de cambios* por las áreas, serán aplicados en Delphos **20 días** después de la fecha de corte de cada trimestre.
6. Las reprogramaciones solicitadas serán válidas solo para las tareas con fechas planificadas programadas posterior al período de evaluación.

Ciclo de Seguimiento y Evaluación del POA

Cortes por trimestre			
31 de marzo	30 de junio	30 de septiembre	31 de diciembre

